Tidsplan fas 2

Överenskommen tidsplan FAS 2

Överenskommelser Fas 1 är ingångna

25-11-27 | 25-12-01 | 25-12-15 | 26-01-20 | 26-02-01 | 26-02-20 | 26-03-05 | 26-03-16 | 26-03-30 | 26-04-02 | **26-04-07** | **26-04-21** | 26-05-13 | 26-05-20 | 26-06-01 | 26-06-08 | **26-06-29** | **26-07-06** | **26-07-28**

Svk levererar utkast rapport-struktur till Ei för diskussion

Kapacitet i anslutningspunkter Svk till underliggande nät

Kapacitet i anslutningspunkter regionnät till underliggande nät

Lokalnät levererar data/information till utpekat Regionnät

Regionnät levererar aggregerad data/information till Svk

Svk levererar preliminärt utkast rapport till Ei + DSO för diskussion

Svk levererar utkast rapport till Ei + DSO

Svk levererar rapport till Ei för godkännande

Ei godkänner rapporten

Svk levererar FNA-rapport till ACER, kommissionen, regeringen

Utskick av enkät marknadshinder & digitalisering

Sista svarsdag marknadshinder & digitalisering

Diskussion innehåll och slutsatser marknadshinder & digitalisering

Slutsatser marknadshinder & digitalisering sammanställda

Möte: Avstämning datainsamling Utmaningar, tolkning Svk + DSO

Möte: Avstämning (icke)levererad data Svk + DSO+ Ei

Möte: Diskussion rapport Svk + DSO+ Ei

Möte: Diskussion rapport Svk + DSO+ Ei

Nyhetsbrev 2 från Ei
Syfte: Säkerställa att alla DSO:er har information om vilken data/info som ska levereras, till vem och när

Energiföretagen webbinar
Genomförandet av FNA i Sverige

Nyhetsbrev 3 och 4 från Ei
Syfte: Påminna om att det börjar bli dags att leverera data

Energiföretagen webbinar
Lösa ut frågor om inlämnande av data/info

Nyhetsbrev 5 från Ei
Syfte: Informera DSO:er om vad deras inlämnade data har använts till. Skapa engagemang för kommande FNA.

Energiföretagen webbinar (aug)
slutresultat och förbättringar

Confidentiality: C2 - Intern
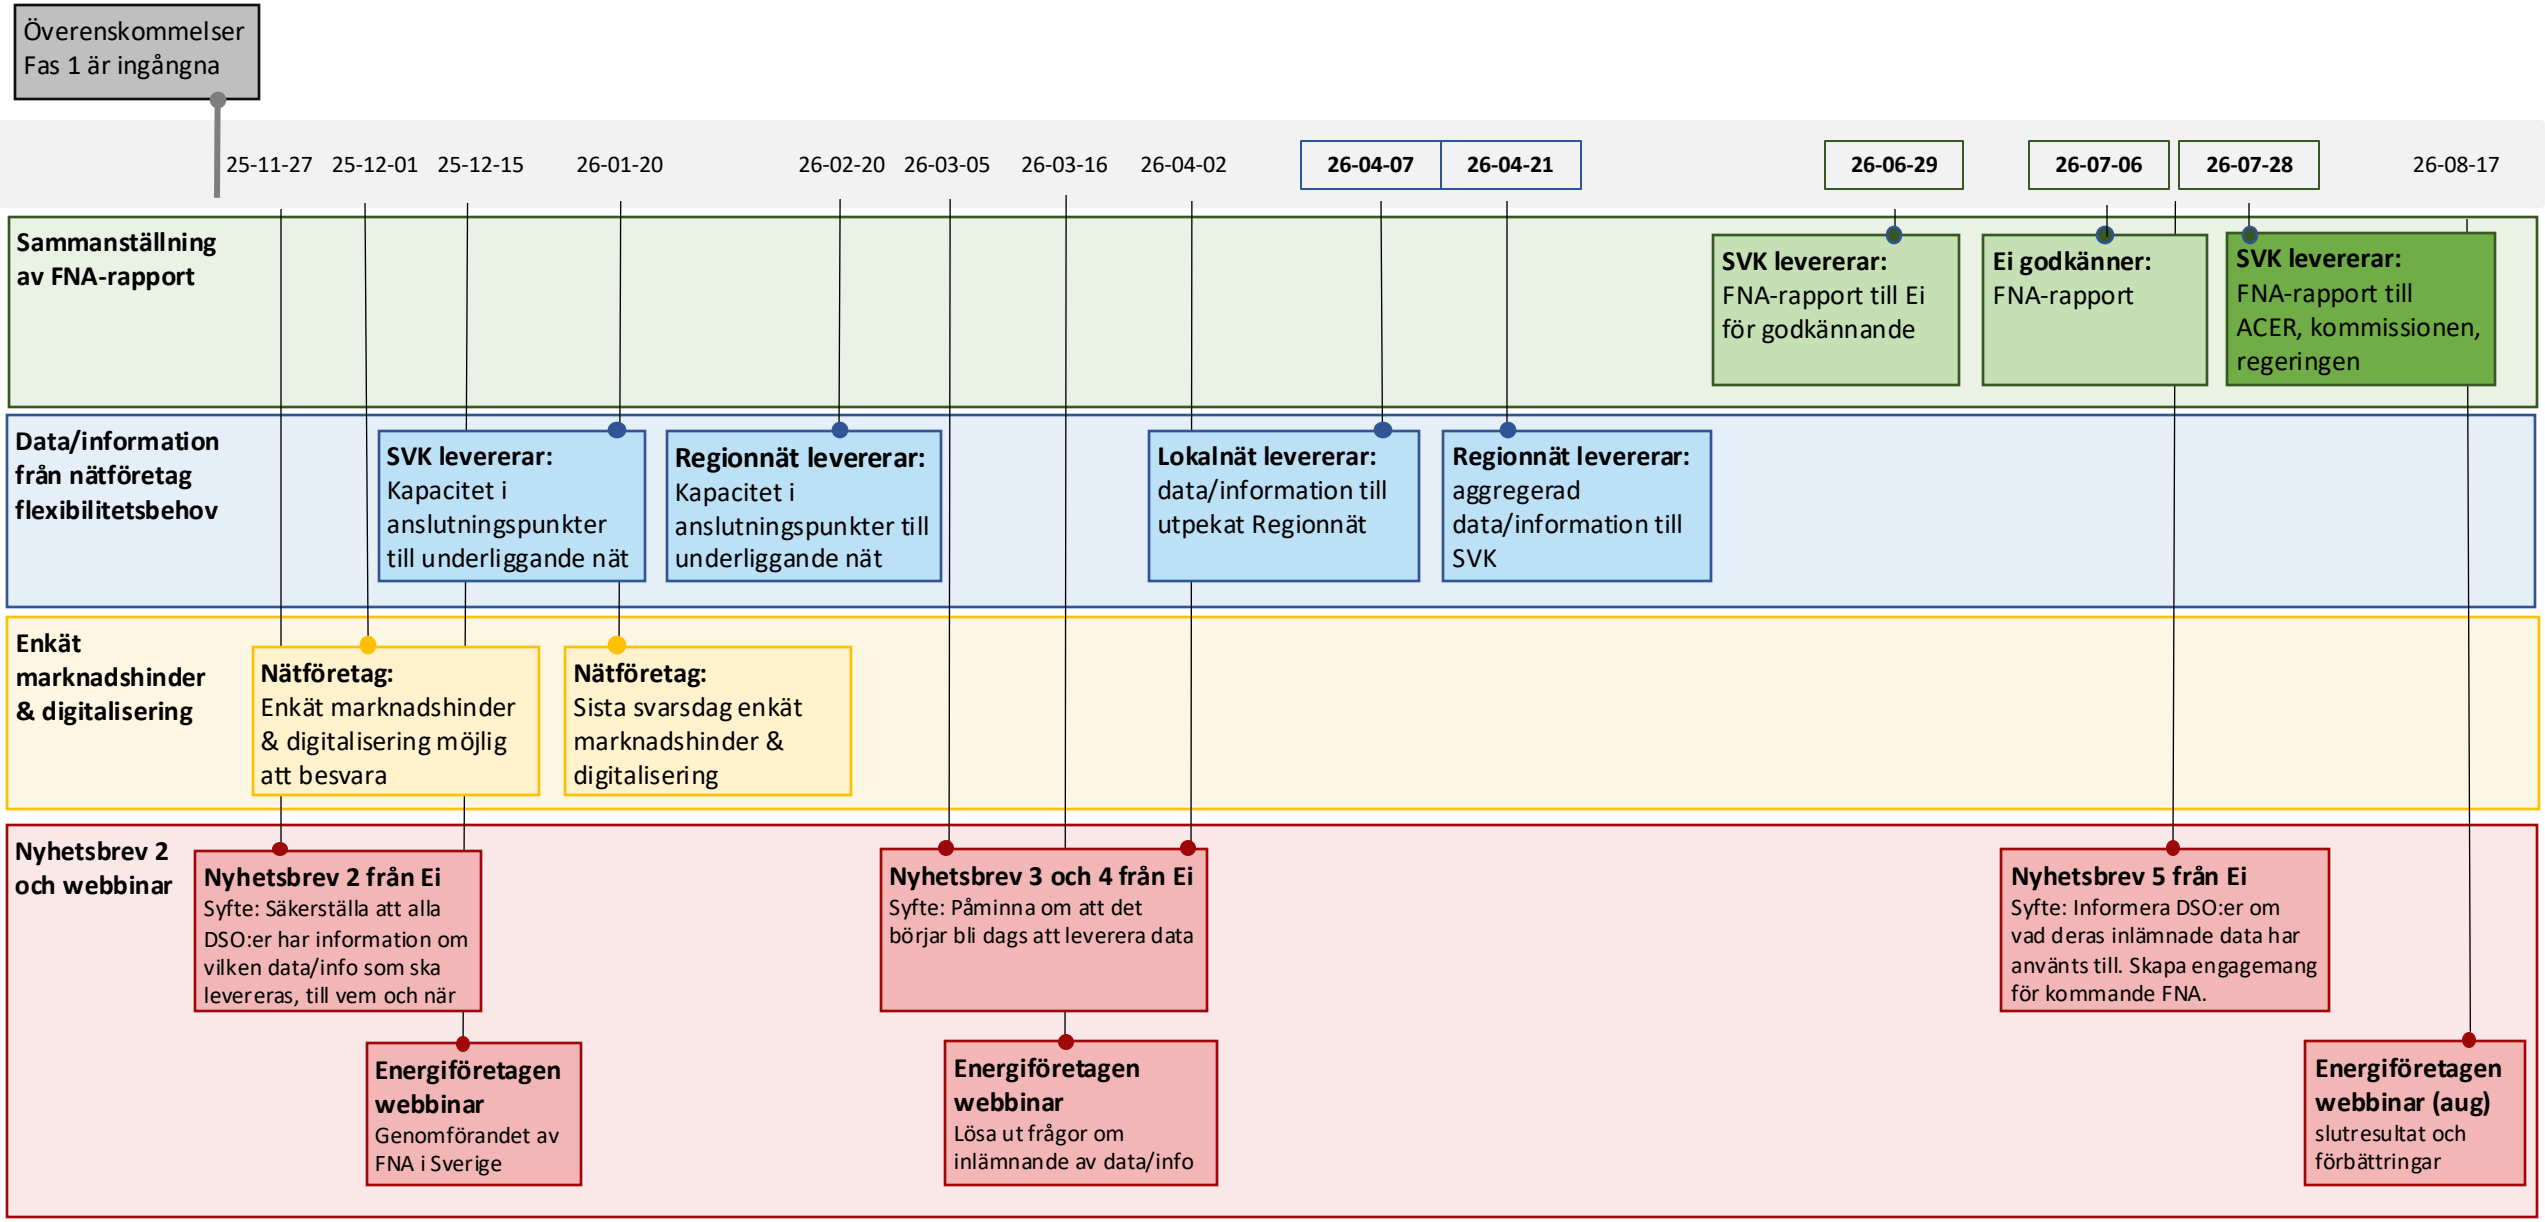
Tidsplan för svenskt genomförande av FNA 2026
